

03

고로~우보간 국도 확포장 적기추진

총사업비	18,200백만원	사업구분	임기내	계속	추진진도	완료	100 %
------	-----------	------	-----	----	------	----	-------

□ 최종목표

- 고로~우보간 국도 28호선 확포장

□ 사업개요

- 사업기간 : 2014 ~ 2021 (7년간)
- 위 치 : 고로~우보간 국도 28호선
- 사업비 : 18,200백만원 (국 100%)
- 사업량 : L=1.9km
- 사업내용 : 도로 선형개량 및 길어깨 확장

□ 연차별 추진계획

세부사업명	임기전	'18 하반기	'19	'20	'21	'22.6	임기후
고로~우보간 국도 확포장	실시설계 및 착공	공사추진	공사추진	공사추진	준공		

□ 연차별 투자계획


(단위 : 백만원)

사업명	구분	총계	이전	임기내						임기후
				계	'18	'19	'20	'21	'22.6	
고로~우보간 국도 확포장	국비	18200	4,300	13,900	3,200	3,000	4,000	3,700		

□ 추진상황

- '21년 상반기(6.30.)까지 실적
 - 2011. 12월 : 기본 및 실시설계(부산지방국토관리청)
 - 2016. 08월 : 제4차 국도건설 5개년 계획 반영
 - 2017. 03월 : 공사 착공
 - 2021. 03월 : 공사 준공

□ 증빙자료

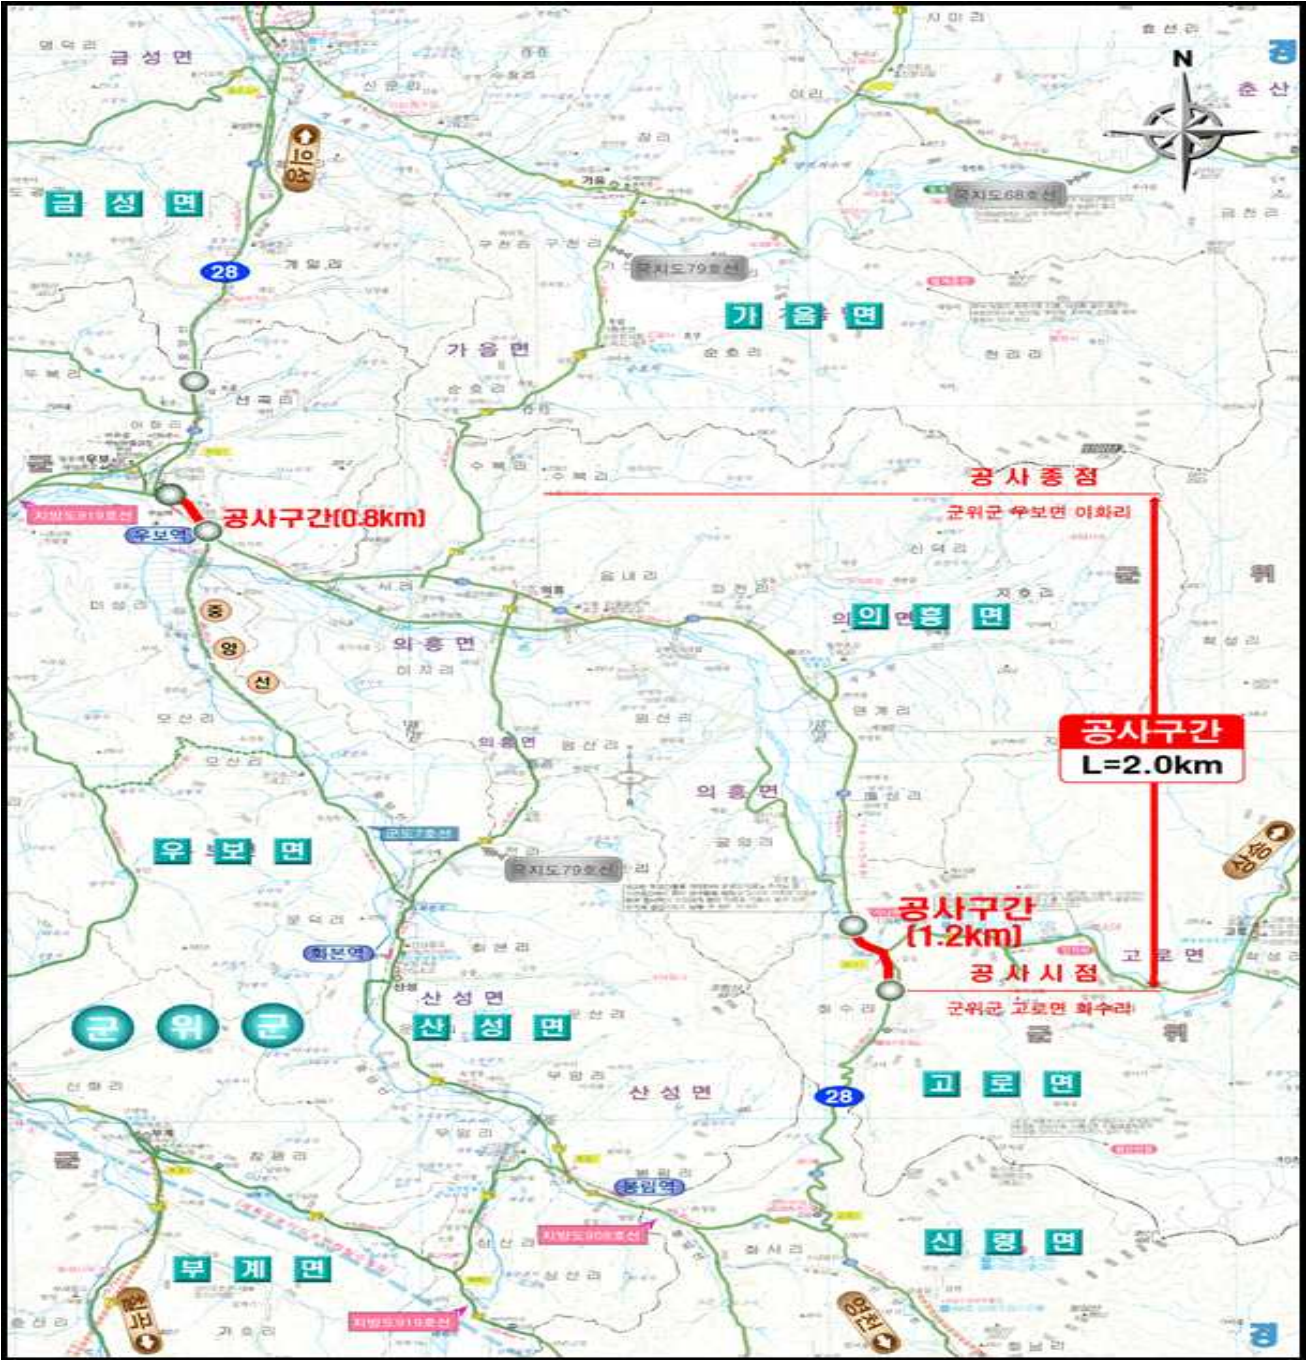

주관부서 건설교통과장 이명우 ☎ 380-6330 도로시설담당 장용석 ☎ 6391 담당자 김재현 ☎ 6392
